

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 1146

с. Щасливе

«23» 10 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Барбулов Валерій Леонідович** (далі – «Підрядник»), який діє на підставі виписки з ЄДР, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони - «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Фізична особа-підприємець Барбулов Валерій Леонідович

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому - «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** згідно дефектним актом і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **60 109,00 грн. (шістдесят тисяч сто дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ** Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору. Ціна договору є твердою.

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;
- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;
- урахування інфляційних факторів;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

8.4. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного та авторського нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного та/або авторського нагляду.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення

будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року .

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Зміни умов даного договору можливі при взаємній згоді Сторін, з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

13.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) -

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Стаття 14. Додатки до договору

Додаток № 1 – план фінансування робіт

Додаток № 2 – графік виконання робіт

Додаток № 3 – Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни.

Стаття 15. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39

Код ЄДРПОУ: 43946694

Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ

МФО (код банку): 820172

UA 45 820172 0344271003400135704

тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО/
МП підпис



ПІДРЯДНИК:

Фізична особа підприємець
Барбулов Валерій Леонідович

Місцезнаходження: 03048, м. Київ, вул. І.
Пулюя, 2, кв. 229

Р/р UA793052990000026006016204853 в
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

ІПН 2801308457

Платник єдиного податку. Не платник ПДВ

Виписка з ЄДР від 16.11.2005р

№25110000000000898

ФОП

/ Валерій БАРБУЛОВ/
МП підпис



План фінансування робіт


Найменування робіт:

Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області

Об'єкт	2023 рік
	з дати підписання - грудень
Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області	60 109,00 грн. без ПДВ

Від Підрядника: фон
М.П.

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Валерій БАРБУЛОВ

Валерій МАКАРЕНКО

Графік виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області

№ з/п	Найменування робіт	2023 рік
1	Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області	з дати підписання - грудень

Від Підрядника: фон
М.П.

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Валерій БАРБУЛОВ



Валерій МАКАРЕНКО

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)
Підрядник ФОП Барбулов В.Л.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по**
вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах станом на 10 жовтня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	54,15400	54,15400	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2,87600	2,87600	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	38,35200	38,35200	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	12,92600	12,92600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	2,33600	2,33600	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом			
7	Розрахунок N9	Прибуток	56,49000	56,49000	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,40700	0,40700	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,20700	-	0,20700
			-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціни Всього договірної ціни в т.ч. зворотні суми:	57,10400 3,00500 60,10900 60,10900	56,89700 - 56,89700	0,20700 3,00500 3,21200


Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М. Макаренко



Керівник генеральної
підрядної організації

В.Л. Барбулов

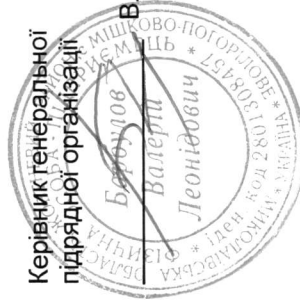

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 23 "

20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням
місць контейнерів твердих відходів по вул.Гоголя в с.Дударків Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	32	
2	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	32	
3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	31,2	
4	Перевезення ґрунту до 5 км	т	31,2	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (40 см)	м3	12,8	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (15 см)	м3	4,8	
7	Улаштування шару з плівки поліетиленової	м2	32	
8	Плівка поліетиленова чорна 100мкр	м2	36,8	
9	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	32	
10	Сітка армуюча 100*100мм ф4мм	м2	32	
11	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	32	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до товщ. 10 см)	м2	-32	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 60,109 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ № 24
(посилання на документ про затвердження)

"23" 10 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул. Гоголя в с. Дударків
Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області	56,490	-	-	56,490
		Разом по главі 2:	56,490	-	-	56,490
		Разом по главах 1-7:	56,490	-	-	56,490
		Разом по главах 1-8:	56,490	-	-	56,490
		Разом по главах 1-9:	56,490	-	-	56,490
		Разом по главах 1-12:	56,490	-	-	56,490
		Кошторисний прибуток (П)	0,407	-	-	0,407
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,207	0,207

1	2	3	4	5	6	7
	Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%		56,897 -	- -	0,207 3,005	57,104 3,005
	Розрахунок N П-137		-	-	3,005	3,005
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		56,897	-	3,212	60,109

Керівник організації

Головний інженер

Керівник відділу



Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул. Гоголя в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Барбулов-318 п.3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

56,490 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0532 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,006 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,32	3341,33	3060,43	1069	90	979	3,7000	1,18	1,18
2	КР1-7-5	Планування площі ручним способом, група 2	1000 м2	0,032	280,90	792,45	642	51	254	8,0520	2,58	2,58
3	КР20-41-2	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,312	20050,39	2072,06	697	51	646	2,1500	0,67	0,67
4	СЗ11-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	31,2	2235,29	536,53	1944	260	167	5,4516	1,7	1,7
5	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (40 см)	100м3	0,128	163,23	62,31	10625	148	1944	0,0990	3,09	3,09
6	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (15 см)	100м3	0,048	62,31	10,31	14662	148	322	26,0000	3,33	3,33
					83008,87	16912,45	14662	148	2165	37,5838	4,81	4,81
					2032,42	3698,88	14662	148	473	39,0000	1,87	1,87
					305455,18	145130,86	14662	148	6966	20,9666	1,01	1,01
					3076,32	2063,46			99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 КБ26-30-1	Улаштування шару з плівки поліетиленової	10 м2	3,2	123,21	-	-	394	394	-	1,4400	4,61
8 С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 100мкр	м2	36,8	123,21	-	-	539	-	-	-	-
9 КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,32	14,65	-	-	58	58	-	2,0600	0,66
10 С111-872 варіант 1	Сітка армуюча 100*100мм ф4мм	м2	32	180,58	-	-	8666	-	-	-	-
11 КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,32	180,58	-	-	27765	1493	226	54,5200	17,45
12 КР18-34-2 к=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до товщ. 10 см)	100м2	-0,32	4664,73	-	-	-12907	-260	-	9,5000	-3,04
Разом прямі витрати по кошторису				40333,65			54154	2876	12926		34,43
Разом будівельні роботи, грн.				812,82					1315		13,19
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							56490				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							53,2				
Кошторисна заробітна плата, грн.							5006				

Склав

Перевірив

Барбулов
Володимир
Леонідович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт майданчика споруди для збирання відходів з улаштуванням місць контейнерів твердих відходів по вул. Гоголя в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34,43	83,52				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,1	98,42				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3,09	104,14				
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	5,58	145,97				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	53,2					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	7,6474752	501,71 3836,81				
8	+КБМ212-1550	Віброушліщувачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	19,849648	360 7145,87				Оренда
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	31,2	62,31 1944,07				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		12926,75				
		Дизельне паливо	кг	32,655					
		Мастильні матеріали	кг	2,065					
		Гідравлічна рідина	кг	0,153					
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти							
10	+С111-872	Сітка армуюча 100*100мм ф4мм	м2	32	270,8 8665,60	264,65 8468,80	0,84 26,88	5,31 169,92	30 км.
11	+С111-1720	Плівка поліетиленова чорна 100мкр	м2	36,8	14,65 539,12	14,14 520,35	0,22 8,10	0,29 10,67	30 км.
12	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2016	610,12 123,00	590,09 118,96	8,07 1,63	11,96 2,41	30 км.
13	+С1421-9723	Щебінь фр. 20-40мм	м3	6,048	1248 7547,90	1248,00 7547,90	- -	- -	
14	+С1421-10634	Пісок природний річковий	м3	15,36	582,4 8945,66	582,40 8945,66	- -	- -	
15	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (F200W6)	м3	3,264	3839,3 12531,48	2897,00 9455,81	867,02 2829,95	75,28 245,72	30 км.
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		38352,76	35057,48	2866,56	428,72	

